




S - CURVE

เป็นเครื่องมือในการ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยการแปลงค่า
งานต่างๆ ให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน และทำเป็นรูปร้อยละจากนั้นนำมาเขียน
เส้นกราฟอ้างอิง(ตามแผนงาน) และกราฟที่ทำได้จริงมาเปรียบเทียบกับกัน

เส้นแสดงความก้าวหน้า S - CURVE โดยทั่วไปแล้วในการดำเนินโครงการมักแบ่งเป็น 3 ระยะ

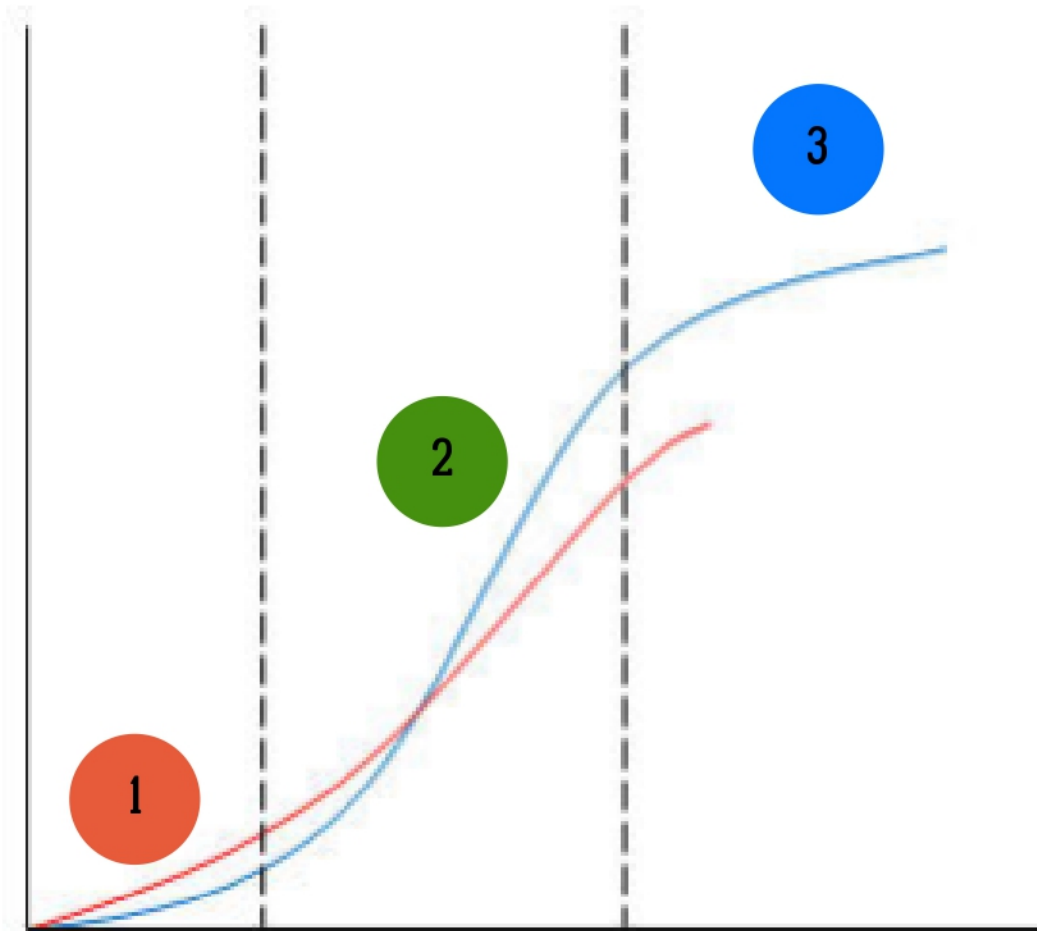

— เส้นแสดงความก้าวหน้า ตามแผนงานที่กำหนดไว้
— เส้นแสดงความก้าวหน้า ที่ทำได้จริง

1 ระยะเริ่มโครงการ ส่วนใหญ่เป็นการเตรียมงาน(Site preparation) ใช้เวลายาก
เส้นกราฟลาดเอียงและโค้งขึ้นน้อย ช่วงปลายของตัว S

2 ระยะกลางโครงการ สามารถทำงานได้หลายกลุ่มมีความก้าวหน้าของงานรวมมาก
ใช้เวลาน้อย เส้นกราฟลาดเอียงและโค้งขึ้นมาก ช่วงลำตัว S

3 ระยะปลายโครงการ เป็นช่วงที่งานแล้วเสร็จไปมาก เหลือเพียงเก็บงานจุดต่างๆ ของ
โครงการ (Site Cleahing) เส้นกราฟลาดเอียงและโค้งขึ้นน้อย ช่วงปลายของตัว S
